



◆建設工事の状況（6月末）

①全面的に床暖房完備の園舎となります。

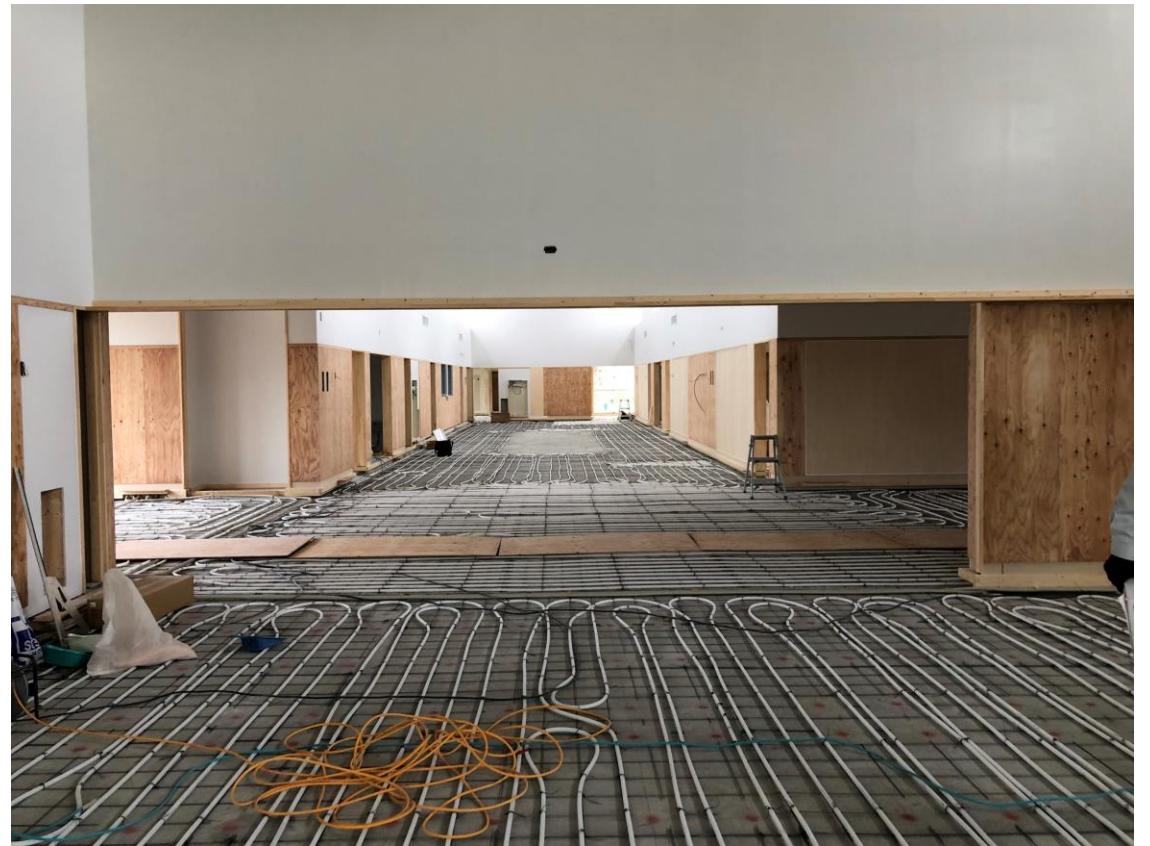

②【6月上旬】床に管（白部分）を布設します。管に温水を流し床面を温めます。

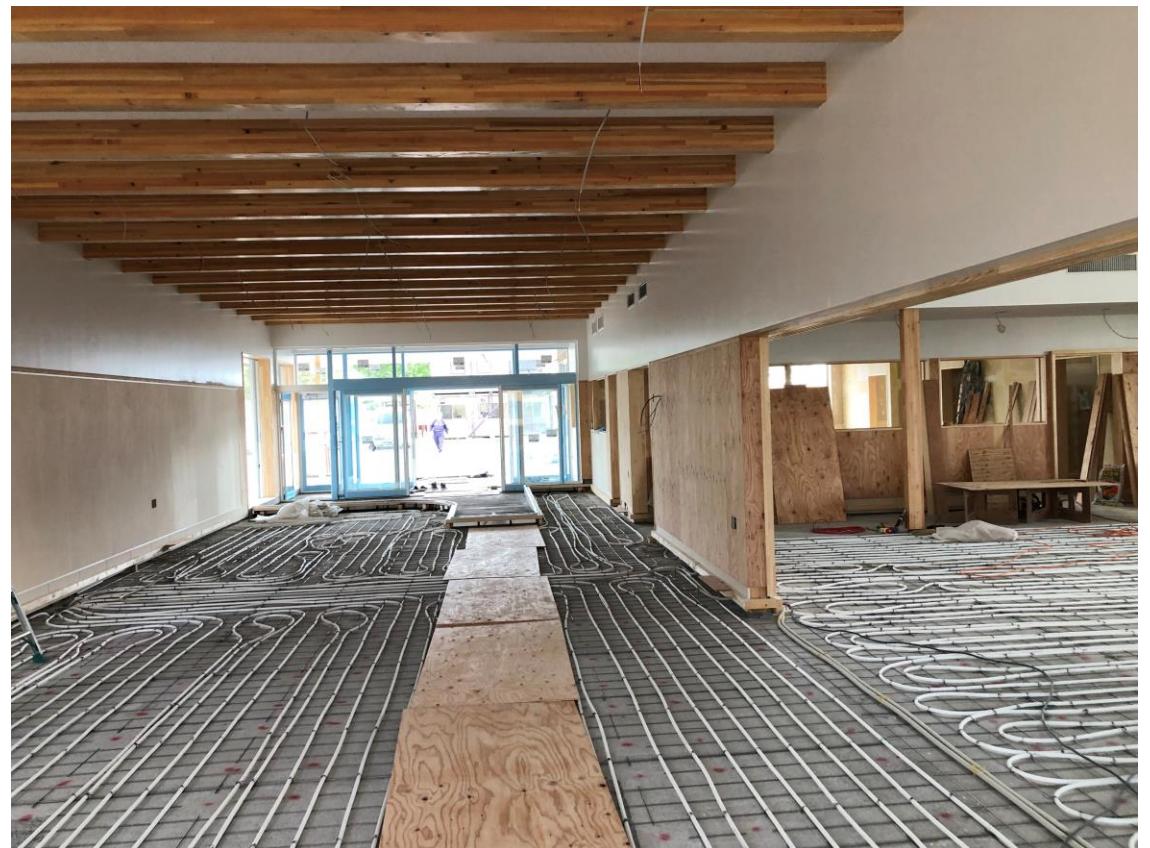

③【6月中旬】管の上に床下地が施工されます。

■遊戯室



■のびのびホール

■保育室（以上児）



④ 【6月下旬】床下地の上にフローリングが施工されます。

■保育室（未満児）



■玄関エントランスホール


■保育室（以上児）



⑤事務室の床は電源位置を調整できるOAフロアとなります。（左写真）施工前 （右写真）施工後



⑥調理室の状況です。厨房機器は7月中旬に設置予定です。

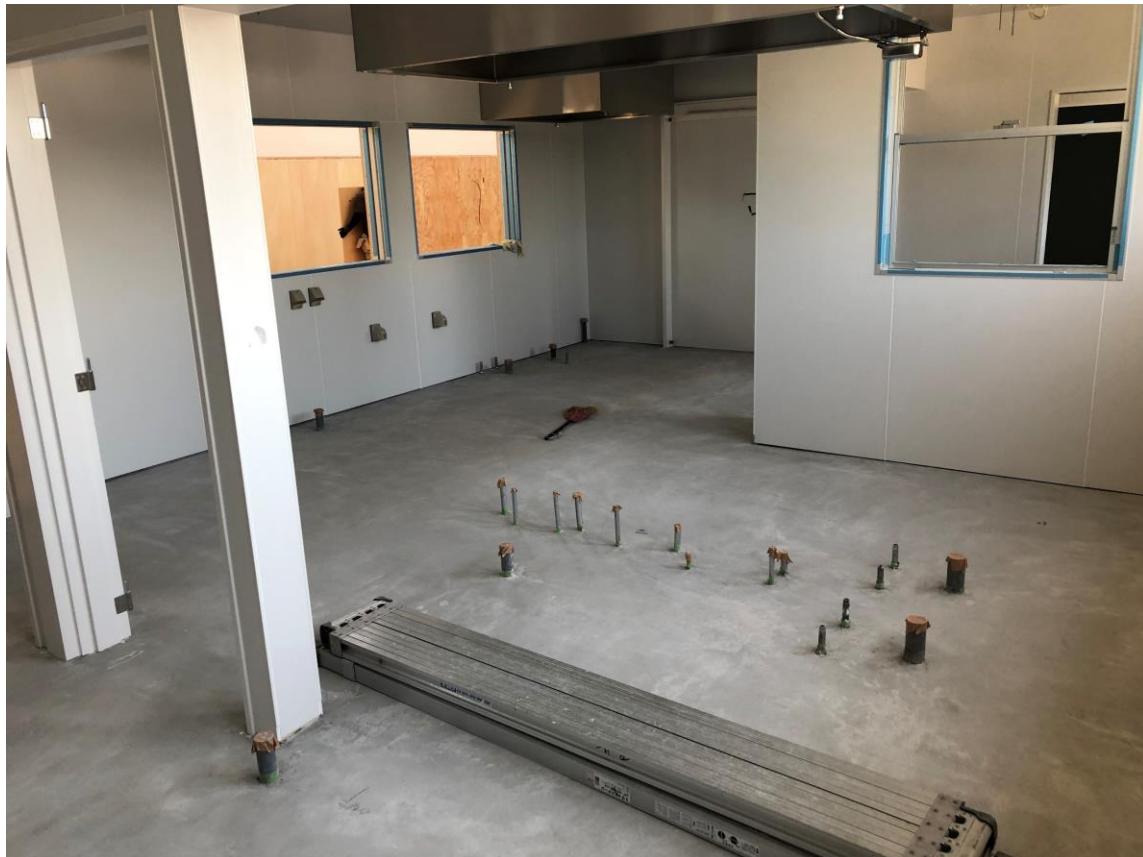

⑦機械室に各種機器が設置されています。



⑧外周りの工事も進められています。



■砂場工事です。大きな砂場となります。



■テラスのウッドデッキが施工されました。



■西側にはスロープが設置されます。



⑨相撲場前の駐車場工事の状況です。【6月上旬】



【6月中旬】



【6月下旬】



⑩園舎正面からの様子です（6/24撮影）

